

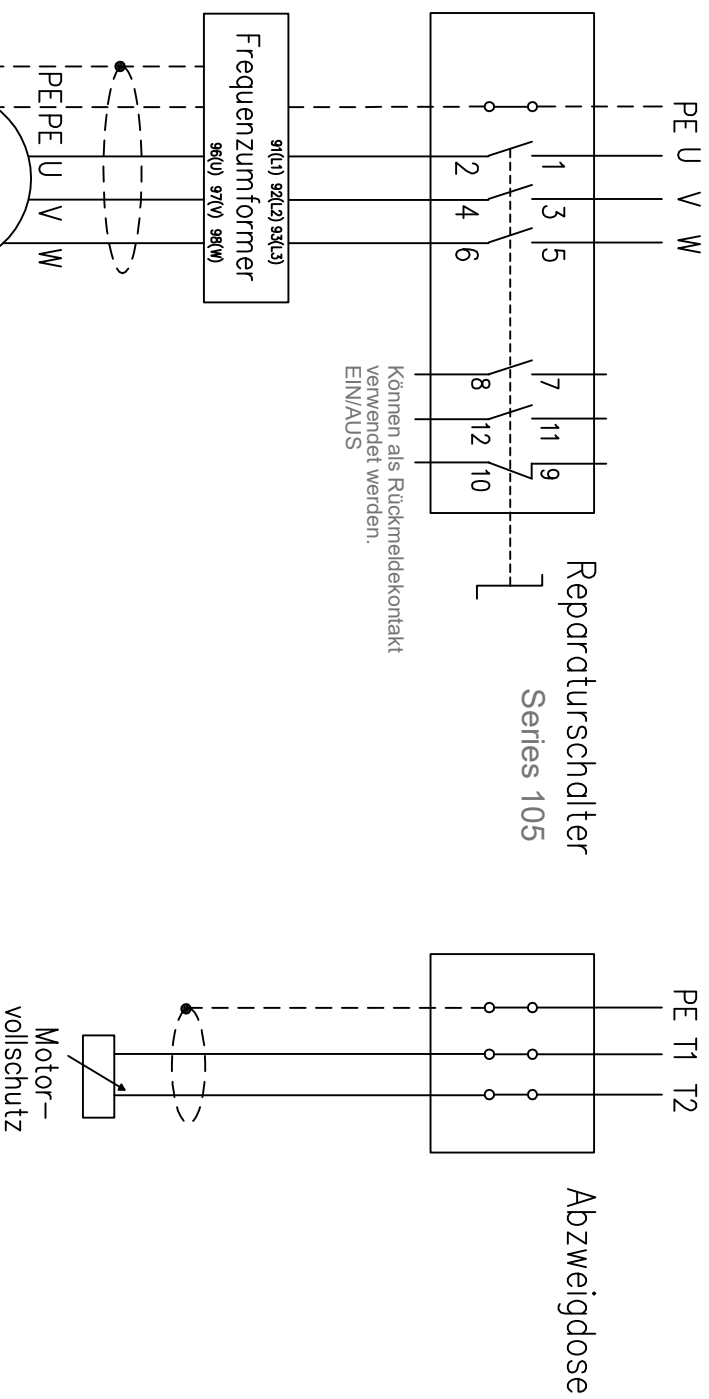


Zuleitung und Sicherungen bauseits Vor Inbetriebnahme alle Klemmstellen nachschrauben

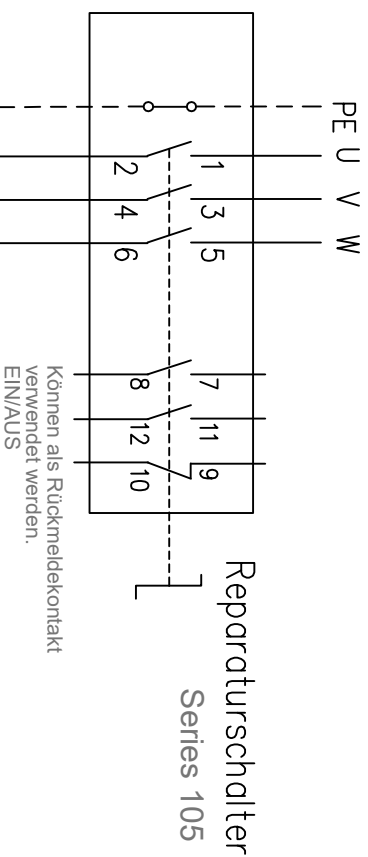

P = _____ kW (Daten des entsprechenden Motors nehmen)
U = 400 V
I = _____ A (Daten des entsprechenden Motors nehmen)
Querschnitt = _____
Der Querschnitt für die Zuleitung muß bei einer größeren Länge und einer starken Bündelung überprüft werden !

Motor- typenschild	Brückenordnung bei Direktanlauf
230/400V	bei 230V Δ
	bei 400V Y
400V/660V	bei 400V Δ
	bei 660V Y

Var Ort		Datum	22.01.08	RÖX Klimatechnik GmbH		TEL	02743-807-0	Proj.-Nr.:	
Var Ort		Beatr.	D. Gernard	Langenbacher Str. 25		FAX	02473-807-153	Fabr.-Nr.:	
Var Ort		Gepr.		57536 Weitefeld					
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	DN	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	Schaltplan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16				
